

## **Progetto Piansecco – Riattazione/Ampliamento capanna**

### **N°04 - Aggiornamento 18 luglio 2019**

Muro di sostegno lato est terminato.

Muro protezione valanghe a ovest in esecuzione.

Elevazioni pian terreno completate, e si sta ora procedendo con la scala esterna d'accesso alla terrazza, e con la platea della terrazza stessa.

I fori e la posa del fascio tubiero per la pompa geotermica sono terminati. La trivella è stata rispedita a valle con il secondo, e ultimo intervento dell'elicottero speciale K-Max.

Sono stati trasportati in quota le tre bobine da 2'000 kg/pezzo per la posa del cavo elettrico per la elettrificazione della capanna (collegamento cabina distribuzione a Cioss Prato).

I cavi elettrici e la fibra ottica sono stati posati. Da lunedì ci sarà l'alimentazione elettrica provvisoria per il cantiere.


Gruppo lavoro Progetto Piansecco

Alcune foto...

**11 luglio 2019 – Bobine cavo elettrico pronte per tiraggio verso valle**



**11 luglio 2019 – Trivella in partenza verso valle**

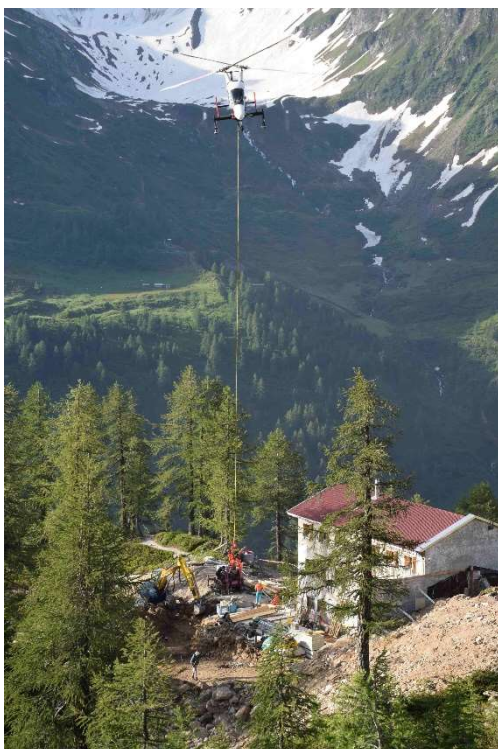

**16 luglio 2019 – Muro sostegno lato est**



16 luglio 2019 – Fascio tubiero geotermica...



...e preparativi platea terrazza

